

TRAVAUX RÉCEMMENT EFFECTUÉS

Les opérations se sont poursuivies sur le chantier de Mirabeau afin de respecter le planning qui annonce un démarrage de centrale fin d'année 2023.

Les équipes se sont concentrées en septembre sur la construction des bassins de décantation pour le recyclage de l'eau et le poste de commandement :

- Coulage des différents voiles ;
- Pose d'une dalle préfabriquée sur les bassins enterrés ;
- Terrassement (remblais) et évacuation de terres excédentaires autour des bassins ;
- Découpe des palplanches en acier autour des bassins.

Elles ont également commencé la construction du bâtiment de commandement et de la centrale en octobre :

- Démolition des anciennes fondations qui ne sont plus adaptées au projet à l'aide d'une pince hydraulique pour limiter les nuisances.
- Création des fondations profondes : 28 nouveaux pieux pour reprendre les descentes de charges qui sont plus importantes (toiture végétalisée, bardage bois, bâtiment en béton matricé qui augmentent les charges par rapport au projet initial...).
- Reprise des têtes de pieux ;
- Création des fondations : coulage des longrines et radiers.

Les éléments en béton sont fabriqués à partir de matériaux Lafarge. Les gravats et terres sont évacués par voie fluviale pour limiter les nuisances et maîtriser l'impact CO2. Ces éléments sont recyclés en centre spécialisé.

POUR RAPPEL : Le mois de Novembre marque l'entrée des travaux en Phase 2 (Cf. planning des Phases ci-dessous)

AGENDA DES TRAVAUX – 3 phases

Phase 1

Travaux sur la future implantation

avril 2022 - août 2023

Phase 2

Travaux sur l'emplacement actuel

nov. 2022 – oct. 2023

Phase 3

Démarrage de la nouvelle centrale

novembre 2023



PROCHAINES REALISATIONS (NOVEMBRE - DÉCEMBRE)


Les prochains travaux couvriront :

- Finition des bassins de décantation pour le recyclage des eaux ;
- Achèvement des fondations telles que les longrines et radiers qui sont en cours de coulage et qui seront terminées courant novembre ;
- Elévations des étages du poste de commandement ;

Les équipes se consacreront cette fin d'année à la construction du bâtiment de commandement. Ce dernier sera coulé en béton de fourniture Lafarge dont une partie est matricé afin de s'insérer dans le paysage urbain. Cette construction accueillera ultérieurement un bardage bois.

La phase 2 du chantier démarrera en janvier 2023 par la démolition de l'ancienne centrale à béton alors que la phase 1 se poursuivra.

La majorité des travaux effectués jusqu'à présent sont enterrés (bassins, fondations...). Dès le mois de novembre les premiers ouvrages sortiront de terre.

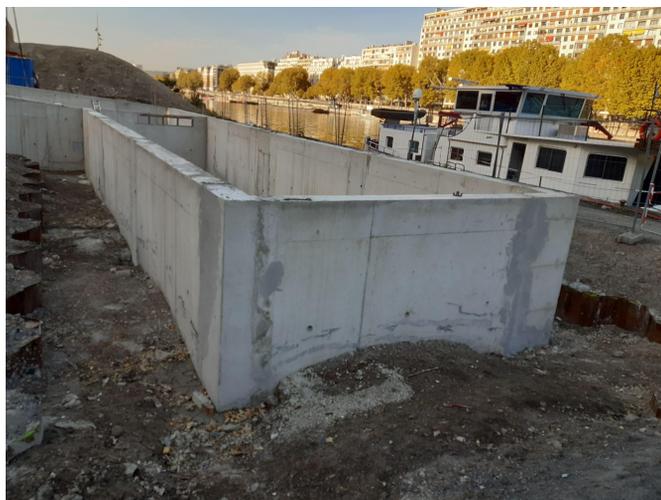

CONTACT

Pour toute question, contactez nous :
au 01 45 18 24 00
ou javel.mirabeau-eu@lafarge.com
